

(一) 项目名称

（二）项目区位


区位情况：中山市大涌镇翠华路及排洪渠延长工程具体位置为：中山市大涌镇大涌镇翠华路。东接岚田村，南面为石井村，西邻西环高速，北面靠近卓旗山。

建设规模：大涌镇翠华路及排洪渠延长工程，项目建设于翠华路。主要改造内容为道路、排水、照明、绿化、交通工程等，排水工程项目为 1101m。

[illegible]

- (1) 该批待处理树木为樟树。一共 46 株，不涉及移植古树名木和古树后续资源、胸径 80cm 以上的树木。
- (2) 树木迁移藏植再利用 46 株。因树木生长态势衰弱，高度参差不齐，需异地迁移藏植处理。

异地迁移藏植现场卫星位置图（苗木迁移藏植地）

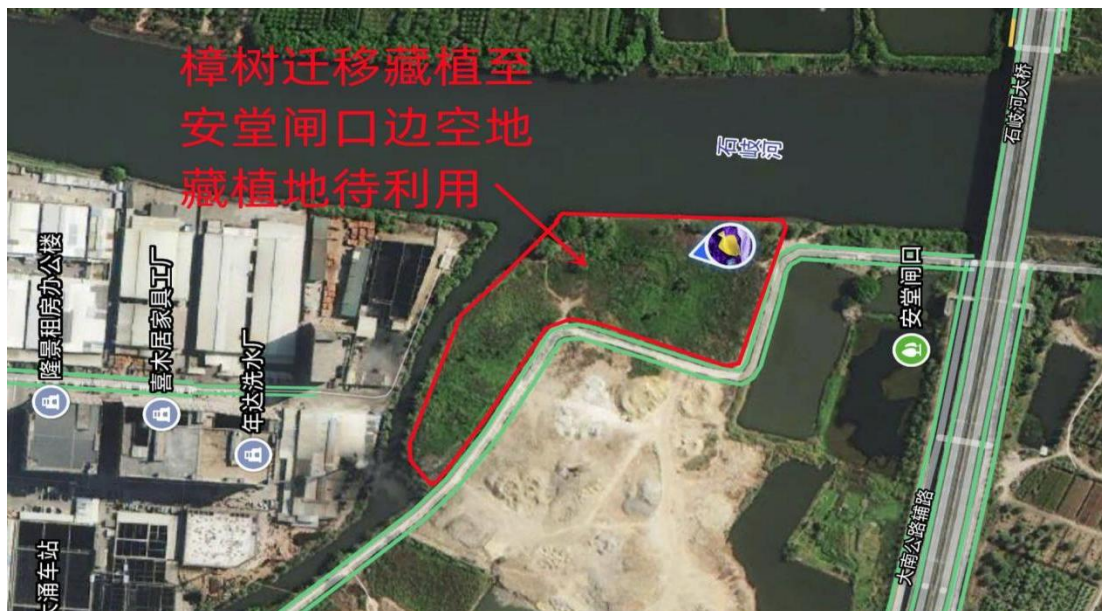

七、具体工程措施及建议

（一）具体工程施工依据

树木迁移应当遵循“即挖即运即种的原则”。具体工程施工应当严格依据相关规范执行：

- 1、《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012
- 2、《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018
- 3、《园林绿化工程项目规范》GB55014-2021

（二）树木保护与迁移原则

- 1、规范程序。对于须移植的树木应依法依规办理移植审批手续，审批结果及时在指定网站做好公开公示。施工时，应在现场显著位置设立告示牌进行公示。对未经审批的移植行为要从严处罚。
